


TAVOLA SICUREZZA CANTIERE - Scala 1:100

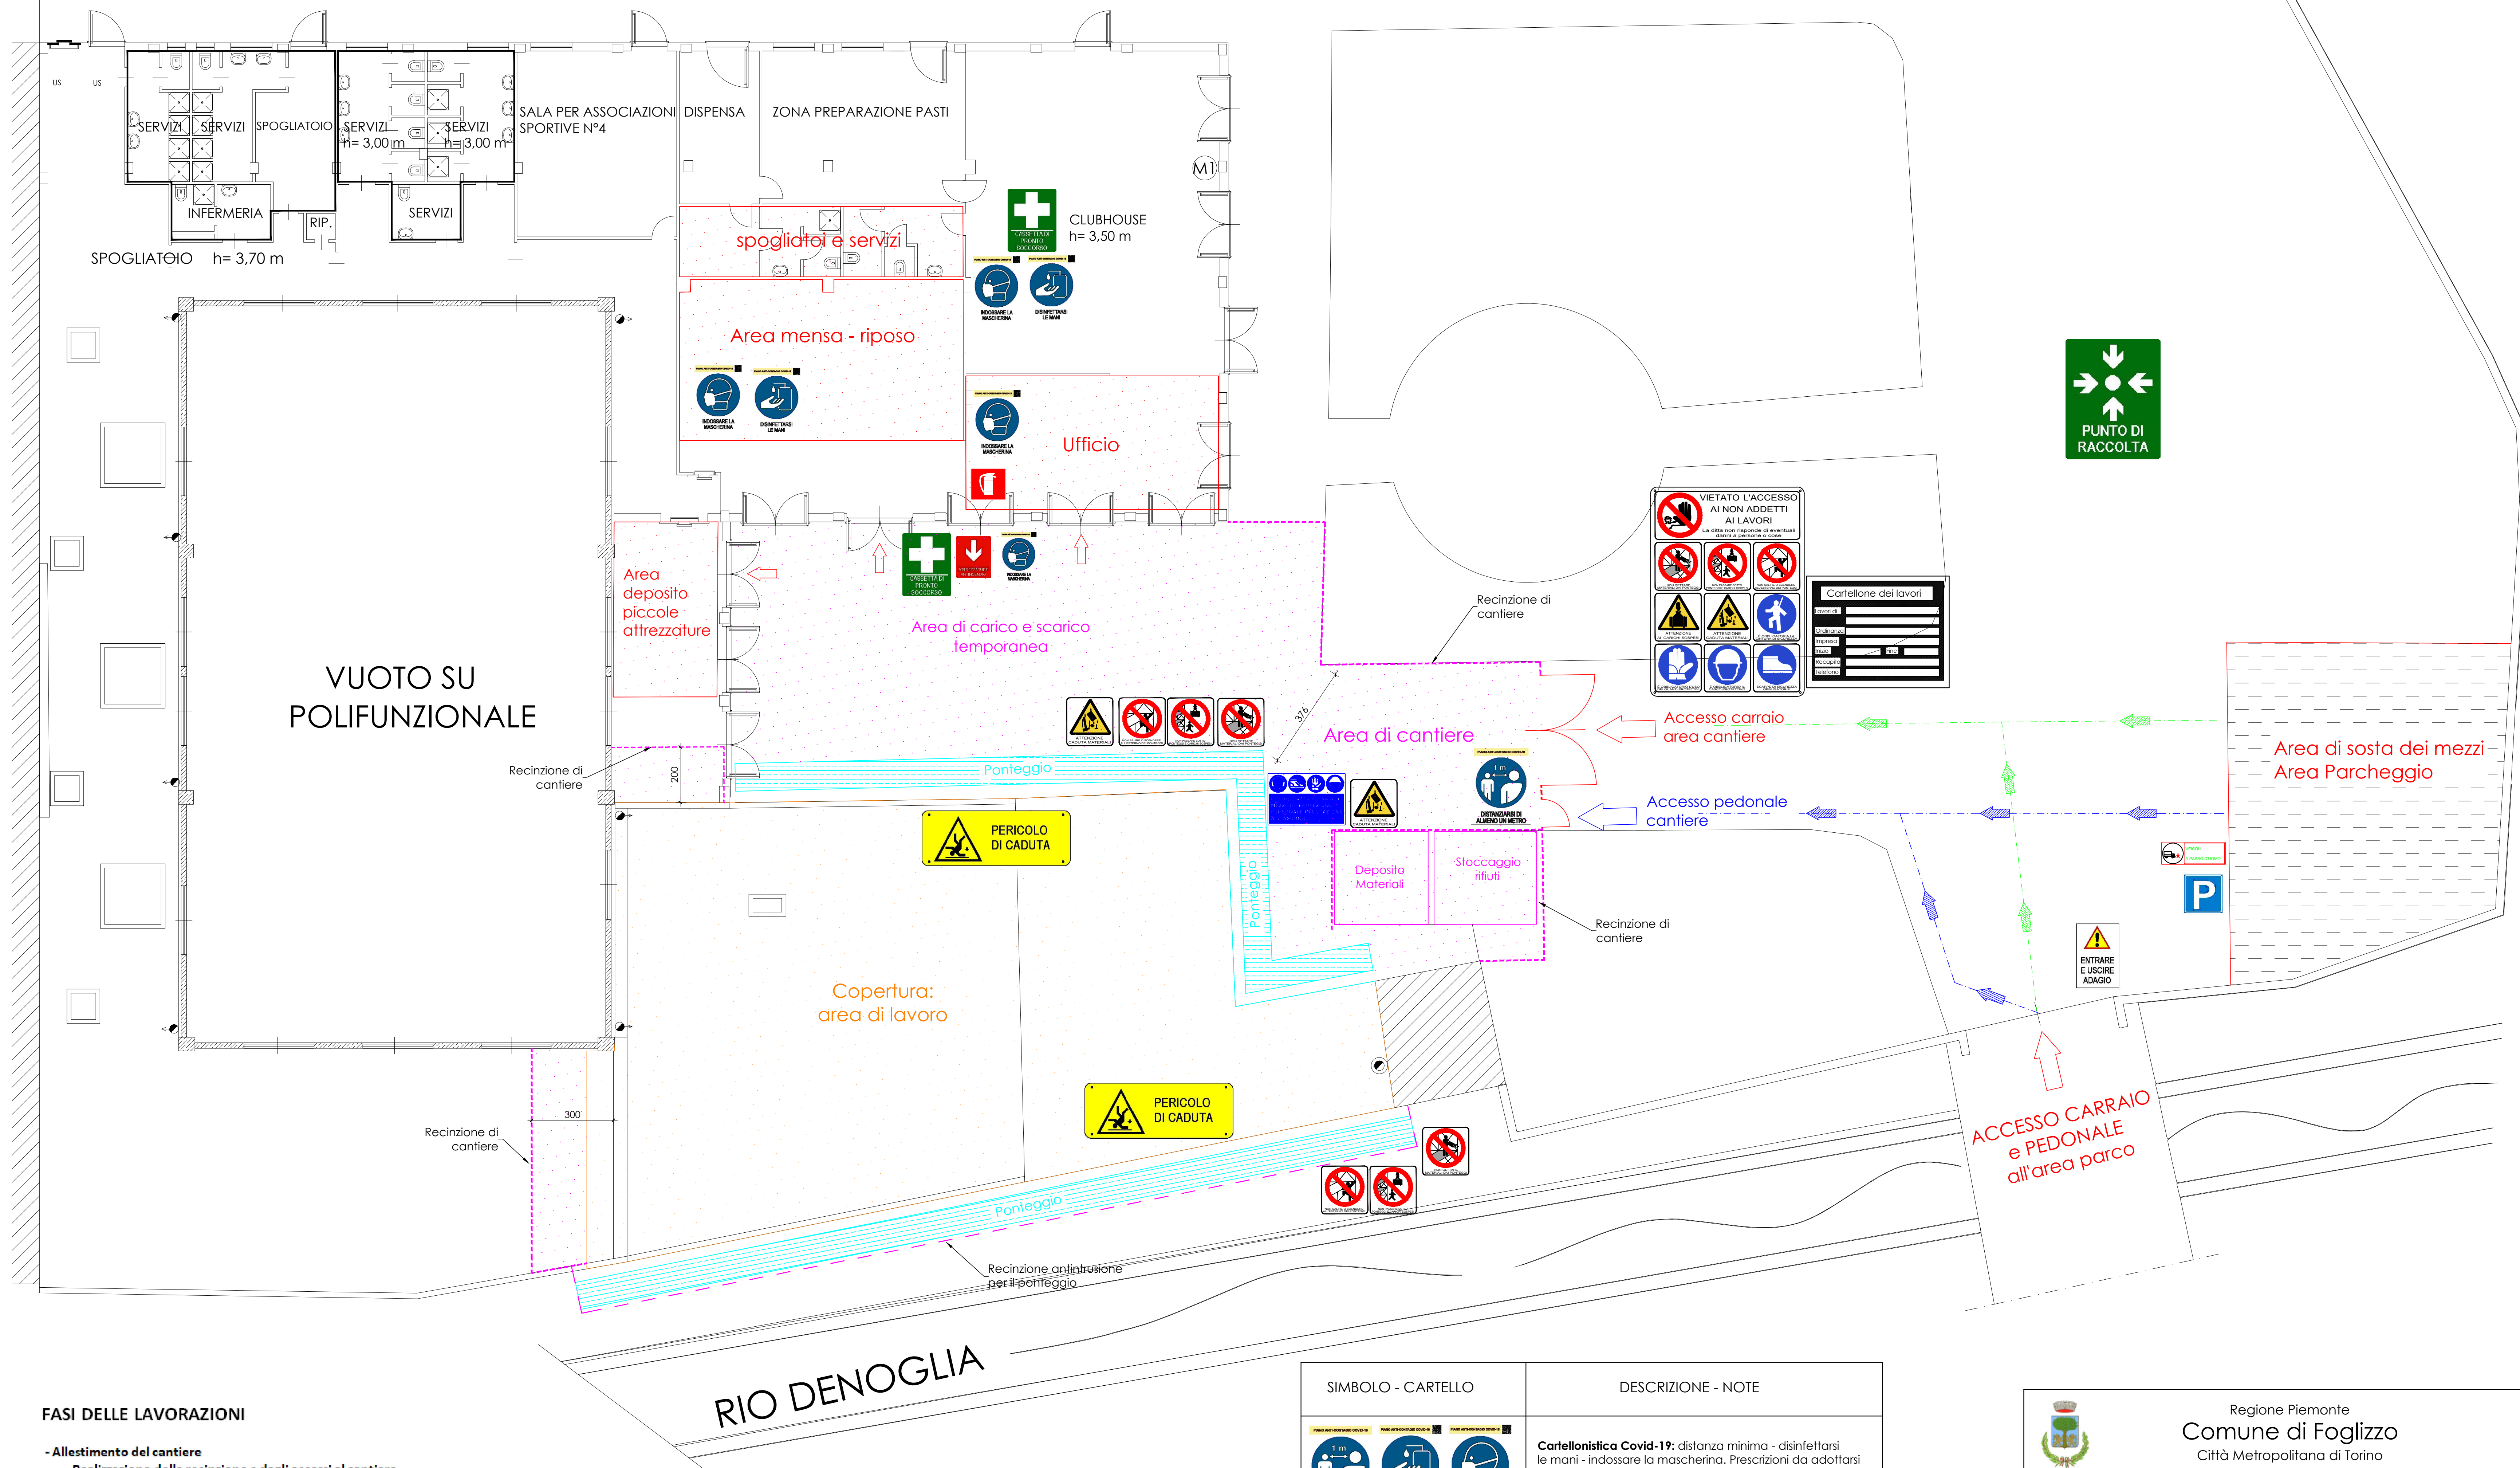

FASI DELLE LAVORAZIONI

- Allestimento del cantiere
 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
 - Realizzazione della viabilità del cantiere
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
 - Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere
 - Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro
- Montaggio e smontaggio ponteaggio
 - Taglio di arbusti e vegetazione, spianamento piano di appoggio ponteaggio
 - Montaggio del ponteaggio metallico fisso
- Rimozioni
 - Rimozione tubazione gas
 - Rimozione di manto impermeabile
- Murature e intonaci
 - Realizzazione di murature
 - Formazione intonaci esterni tradizionali
 - Posa ferri di chiamata con resine
- Cappotti perimetrali e piccolo cartongesso
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
 - Formazione intonaci esterni tradizionali
- Posa isolante su solaio
 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
- Posa orditura il legno
 - Posa listelloni in legno
 - Posa ferri di chiamata con resine
- Posa copertura in lamiera grecata e lattenoria
 - Montaggio di copertura in lamiera grecata
 - Montaggio di scossaline e canali di gronda
- Posa rete gas precedentemente rimossa
 - Realizzazione tubazione di gas precedentemente rimossa
- Posa scala prefabbricata in ferro
 - Montaggio di scala esterna prefabbricata in acciaio
- Smobilizzo cantiere
 - Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
 - Smontaggio del ponteaggio metallico fisso
 - Pulizia generale dell'area di cantiere
 - Smobilizzo del cantiere

SIMBOLO - CARTELLO	DESCRIZIONE - NOTE
	Area di cantiere per manovre, per depositi materiale, per zone di carico e scarico, per smaltimento rifiuti
	Area dei servizi: spogliatoi - mensa - servizi igienici area per deposito piccole attrezzature di lavoro. Area Covid-19 - area principale dove devono essere rispettate le prescrizioni covid
	Area di lavoro: area in cui si svolgono le lavorazioni per la realizzazione della copertura
	Area di parcheggio: per automezzi da lavoro e per auto degli addetti/dipendenti
	Recinzione del cantiere: tipo rete metallica
	Recinzione del ponteaggio antintrusione
	Ponteaggio: allestimento ponteaggio perimetrale
	Percorso automezzi
	Percorso pedoni

SIMBOLO - CARTELLO	DESCRIZIONE - NOTE
	Cartellonistica Covid-19: distanza minima - disinfezzarsi le mani - indossare la mascherina. Prescrizioni da adottarsi nel rispetto delle norme in vigore, in caso di affollamento e in ambienti chiusi
	Divieto di accesso alle persone non autorizzate: da disporre sui cancelli di accesso all'area cantiere
	Segnali di divieto per ponteaggi: non salire e scendere all'esterno dei ponteaggi - non passare sotto i ponteaggi - non gettare materiale dai ponteaggi. Da disporre a terra sui ponteaggi
	Segnali di pericolo per ponteaggi: attenzione caduta materiali dall'alto - pericolo di caduta. Da disporre a terra e sui ponteaggi al piano lavoro
	Segnali di obbligo per uso di DPI: uso di guanti, scarpe, casco, cuffie e mascherine. L'uso di alcuni DPI (cuffie e mascherine) sono funzione del tipo di lavorazione
	Punto di raccolta per le emergenze e in caso di incendio
	Segnali di indicazione cassetta pronto soccorso e estintore: la cassetta pronto soccorso dovrà essere sempre in cantiere (focci deposito) - l'estintore è bene disporlo nell'area uffici.

<div>Regione Piemonte Comune di Foglizzo Città Metropolitana di Torino</div>		
Oggetto: EDIFICIO PLURIUSO EX SAIFA. Lavori di efficientamento energetico di parte della copertura		
Ubicazione intervento: Comune di Foglizzo		
Proprietà: Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6		
Committente: Comune di Foglizzo - Via del Castello, 6		
Tav. N° 09	Oggetto tavola: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO Tavola Sicurezza Cantiere	Scala: 1:100
Disegnatore: Data: 10 luglio 2016 Aggiornamento: tav. n° del 21 luglio 2016		Progetto: Dott. MAGNONE Ing. Antonio Studio tecnico di Ingegneria Via XX Settembre 57/a - 10030 Ronchi di Torino Tel/fax 011-9183058 Cell. 334-9175130 P.I. 07549770019 C.F. MGN NTN 71E26 L219K e-mail: studiomagnoneantonio@alice.it pec: antonio.magnone@ingpec.eu sito: www.studiomagnoneantonio.com Progettazione Strutturale - Energetica e Certificazioni - Sicurezza Cantiere Direzione dei Lavori - Acustica Pratiche VVF - Consulenze Edilizie Imprese
Sintesi e firma del progettista:		Protocollo Comunale:
Annotazioni:		Varianti a: S.C.I.A. Autorizzazione: Foglio n°: Mappale n°:
<small>Questo elaborato è di proprietà esclusiva dello studio ed è tutelato dagli art. 2075-2085 del Codice Civile sul diritto d'autore delle opere artistiche e architettoniche. E' riservato all'autore il diritto esclusivo di riproduzione.</small>		
